

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2015-8)

2015 年第 33 期

水利部规划计划司

2015 年 9 月 11 日

今年 1~8 月,各地累计完成中央水利建设投资计划 1820.7 亿元,较去年同期增加 859.6 亿元,增幅 89.4%。当月完成中央投资计划 356.2 亿元,较上月增加 93.4 亿元。

一、2015 年中央水利建设投资情况

截至 2015 年 8 月 31 日,已累计下达中央水利建设投资 1681.68 亿元,地方累计分解下达 1656.21 亿元、累计拨付项目单位资金 1556.76 亿元、累计完成投资 715.04 亿元,中央投资分解下达率、资金到位率、投资完成率分别为 98.5%、92.6%和 42.5%,项目开工率为 68.1%。中央投资完成率前 5 位的地区有:浙江、江苏、云南、天津和河南;后 5 位的地区是:**大连、河北、江西、吉林和上海**。其中,重大水利工程中央投资完成率前 5 位的地区有天津、江苏、福建、浙江和海南;后 5 位的地区是:**宁波、青海、河北、湖南和广西**。


分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资的落实及

完成情况详见附表 1、附表 2。

（一）投资计划分解下达情况

2015 年已安排中央水利建设投资计划 2613.3 亿元，其中，中央投资 1681.7 亿元，地方配套投资 931.6 亿元。截至 8 月 31 日，各地已分解下达到项目单位年度中央投资计划 2609.3 亿元，投资分解下达率 99.8%，其中中央投资、地方配套投资分解下达率分别为 98.5%和 102.3%。中央投资分解下达率不足 95%的地区有：山东、宁波、新疆、山西、河北、青海、广东。


图1 2015年中央投资计划下达率（按地区分）

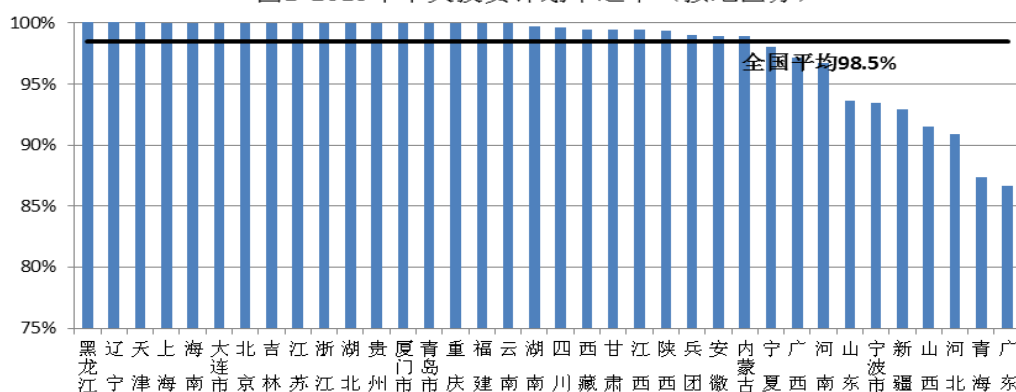

1. 中央预算内投资。2015 年已安排中央预算内水利投资计划 1352.0 亿元（中央投资 837.5 亿元，地方配套投资 514.5 亿元），地方已分解下达 1368.6 亿元，分解下达率 101.2%。其中，中央投资已分解下达 824.07 亿元，分解下达率 98.4%；地方配套投资已分解下达 544.5 亿元，分解下达率 105.8%。从项目类别看，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）除险加固、水土保持、中型水库、主要支流治理项目的中央投资下达率分别为 100.0%、100.2%、98.5%、100.0%和 98.8%。分地区中央预算内


投资下达情况见图 2。

图2 2015年中央预算内投资下达率
(按地区分)

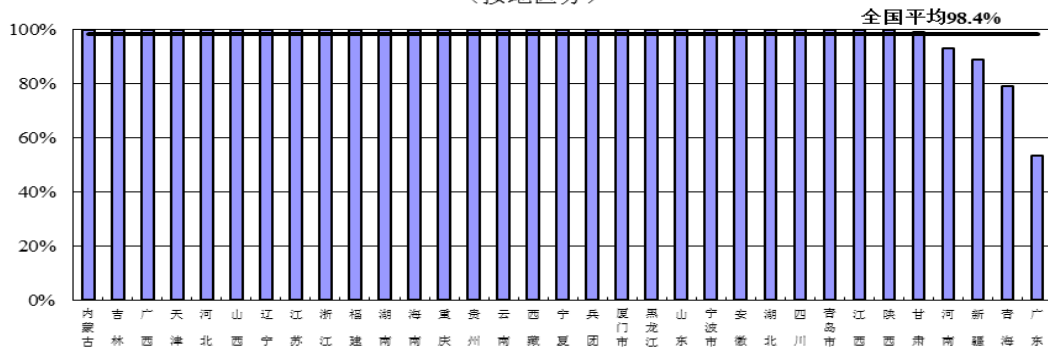

2. 中央财政专项资金。2015 年中央财政水利专项资金预算 1261.3 亿元(中央资金 844.2 亿元,地方配套资金 417.1 亿元),已分解下达 1240.6 亿元,分解下达率 98.4%。其中,中央资金已分解下达 832.1 亿元,分解下达率 98.6%;地方配套资金已分解下达 408.5 亿元,分解下达率 97.9%。从项目类别看,江河湖库水系综合整治、山洪灾害防治项目、农田水利建设和水土保持专项的中央预算分解下达率分别为 100.9%、102.7%和 97.2%。分地区中央财政水利专项资金分解下达情况见图 3。

图3 2015年中央财政水利专项资金下达率
(按地区分)

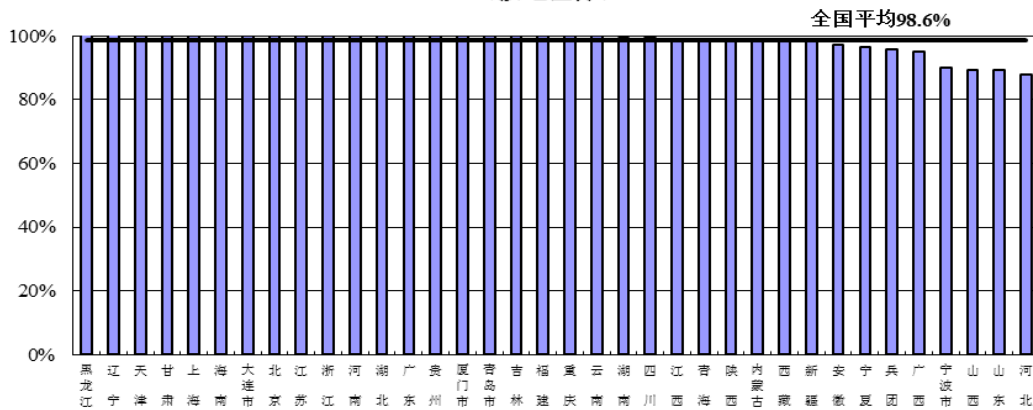

其中,重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 1008.2

亿元（中央投资 608.3 亿元，地方配套投资 399.9 亿元），地方已分解下达 981.0 亿元，分解下达率 97.3%。其中，中央投资已分解下达 596.5 亿元，分解下达率 98.1%；地方配套投资已分解下达 384.5 亿元，分解下达率 96.2%。从工程类别看，重大农业节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资分解下达率分别为 100.0%、100.0%、95.8%、96.7%、100.0%和 97.0%。

（二）资金到位情况

2015 年中央水利建设年度投资计划已拨付项目单位 2153.6 亿元，资金到位率 82.4%。其中，中央投资到位 1556.8 亿元，到位率 92.6%；地方配套投资到位 596.9 亿元，到位率 64.1%。

1. 中央预算内投资。2015 年中央预算内水利建设投资计划已拨付项目单位 1095.6 亿元，资金到位率 81.0%。其中，中央投资到位 778.3 亿元，到位率 92.9%；地方配套投资到位 317.3 亿元，到位率 61.7%。

2. 中央财政专项资金。2015 年中央财政水利专项资金预算已拨付项目单位 1058.0 亿元，资金到位率 83.9%。其中，中央资金到位 778.4 亿元，到位率为 92.2%；地方配套资金到位 279.6 亿元，到位率为 67.0%。

其中，重大水利工程投资已到位 724.7 亿元，资金到位率 71.9%。其中，中央投资到位 552.9 亿元，到位率 90.9%；地方

配套投资到位 171.7 亿元，到位率 43.0%。从工程类别看，重大农业节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资到位率分别为 95.1%、97.6%、75.3%、86.7%、89.6%和 94.0%。


（三）项目开工情况

2015 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 14629 个，较上月增加 2185 个，工程开工率 68.1%，较上月增加 13.8%。其中中央预算内水利投资计划 5118 个，累计开工 3912 个，开工率 76.4%；中央财政水利专项资金预算 9511 个，累计开工 6045 个，开工率 63.6%。项目开工率较高的地区有北京、宁波、厦门、西藏和浙江，较低的地区有：吉林、内蒙古、江西、辽宁和海南。

（四）投资完成情况


已累计完成 2015 年中央水利建设投资计划 1055.2 亿元，完成率 40.4%。其中，完成中央投资 715.0 亿元，完成率 42.5%；完成地方配套投资 340.1 亿元，完成率 36.5%。当月完成中央投资计划 320.9 亿元，较上月增加 88.2 亿元，增幅 37.9%。其中，完成中央投资 217.7 亿元，较上月增加 60.3 亿元，增幅 38.3%；完成地方配套投资 103.2 亿元，较上月增加 27.9 亿元，增幅 37.1%。完成率较高地区有浙江、江苏、云南、天津和河南，较低省份有：大连、河北、江西、吉林和上海。

图4 2015年中央投资完成率
(按地区分)

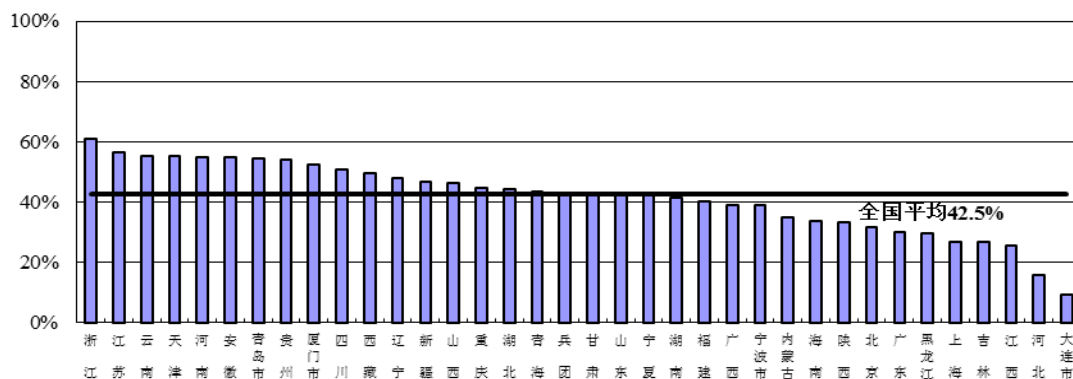

1. 中央预算内投资。已累计完成中央预算内水利投资计划695.0亿元，完成率51.4%。其中，完成中央投资451.1亿元，完成率53.9%；完成地方配套投资243.9亿元，完成率47.4%。从项目类别看，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）除险加固、水土保持、中型水库、主要支流治理项目的中央投资完成率分别为86.7%、41.4%、8.8%、70.0%和31.6%。分地区中央预算内投资完成情况见图5。


图5 2015年中央预算内投资完成率
(按地区分)

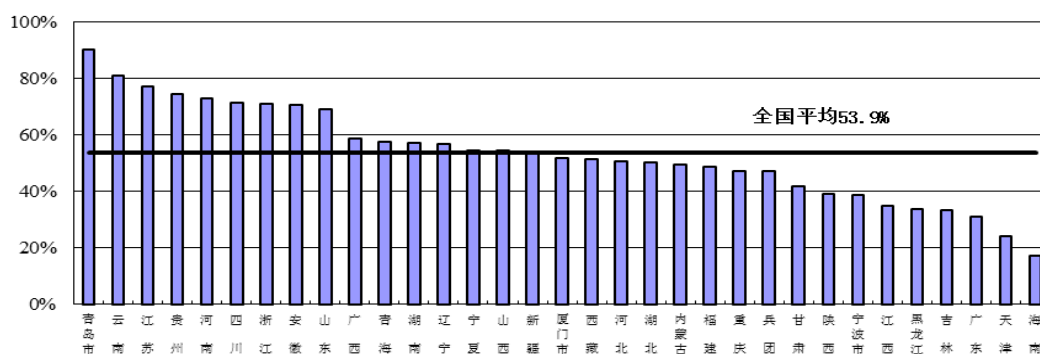

2. 中央财政专项资金。已累计完成中央财政水利专项资金预算360.2亿元，完成率28.6%。其中，完成中央资金263.9亿元，完成率31.3%；完成地方配套资金96.2亿元，完成率23.1%。从


项目类别看，江河湖库水系综合整治、山洪灾害防治项目、农田水利建设和水土保持专项的中央资金完成率分别为 46.5%、30.0%、19.0%。分地区中央财政专项资金完成情况见图 6。

图6 2015年中央财政水利专项资金完成率
(按地区分)

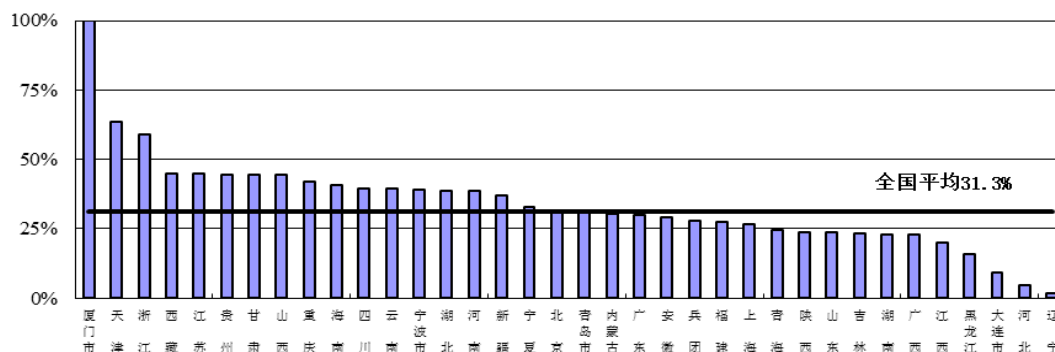

其中，重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 341.6 亿元，投资完成率为 33.9%。其中，完成中央投资 234.0 亿元，完成率 38.5%；完成地方配套投资 107.6 亿元，完成率 26.9%。从工程类别看，重大农业节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资完成率分别为 19.7%、40.8%、31.9%、42.3%、45.6%和 49.1%。

图7 2015年重大水利工程中央投资完成

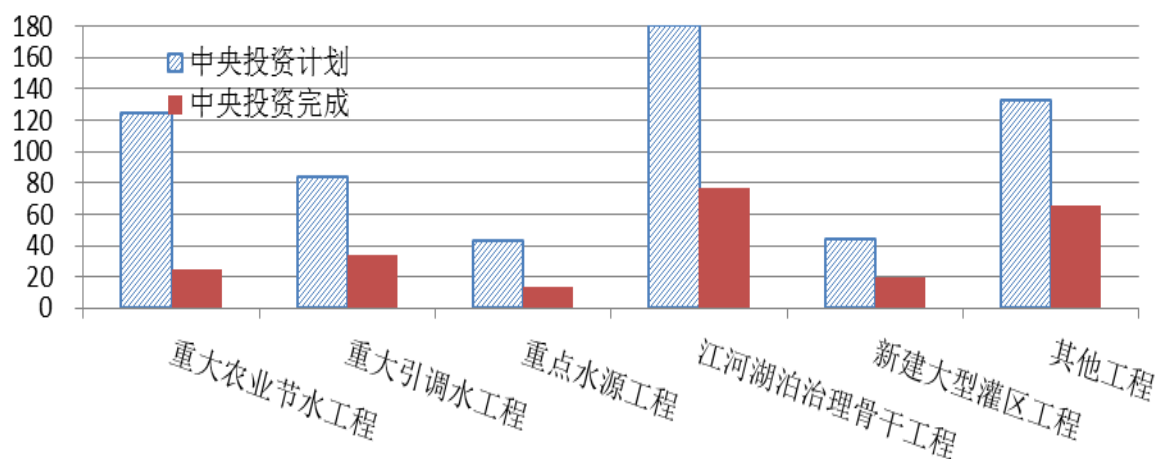

二、2014 年中央水利建设投资情况

截至 2015 年 8 月 31 日，纳入月报统计的 2014 年中央水利建设投资 1604.55 亿元，累计下达项目单位投资计划 1603.9 亿元，累计拨付项目单位资金 1597.4 亿元，项目单位累计完成投资 1513.0 亿元，投资下达率、资金到位率、投资完成率分别为 99.9%、99.6%和 94.3%。
