

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计旬报 2015-11-20)

2015 年第 44 期

水利部规划计划司

2015 年 11 月 25 日

据统计，截至 2015 年 11 月 20 日，中央水利建设投资完成情况如下：


一、2015 年投资计划完成情况

2015 年已安排中央水利建设投资计划 2621.7 亿元，其中，中央投资 1683.3 亿元，地方配套投资 938.4 亿元。各地累计完成年度中央投资计划 2083.8 亿元，投资完成率 79.5%，较上旬增加 5.1 个百分点。其中完成中央投资 1378.1 亿元，投资完成率为 81.9%，较上旬增加 4.9 个百分点；完成地方配套投资 705.7 亿元，投资完成率为 75.2%，较上旬增加 5.5 个百分点。11 月中旬完成 134.0 亿元，其中，完成中央投资 82.2 亿元，完成地方配套投资 51.8 亿元。

年度中央投资计划完成率前 5 位的地区有：上海、浙江、天津、兵团和大连；后 5 位的地区是：**海南、江西、河北、贵州和广西**。其中，重大水利工程中央投资计划完成率前 5 位的地区有天津、海南、青岛、浙江和广东；后 5 位的地区是：**江西、重庆、**

湖南、内蒙古和吉林。


图1 2015年年度投资计划完成率
(按地区分)

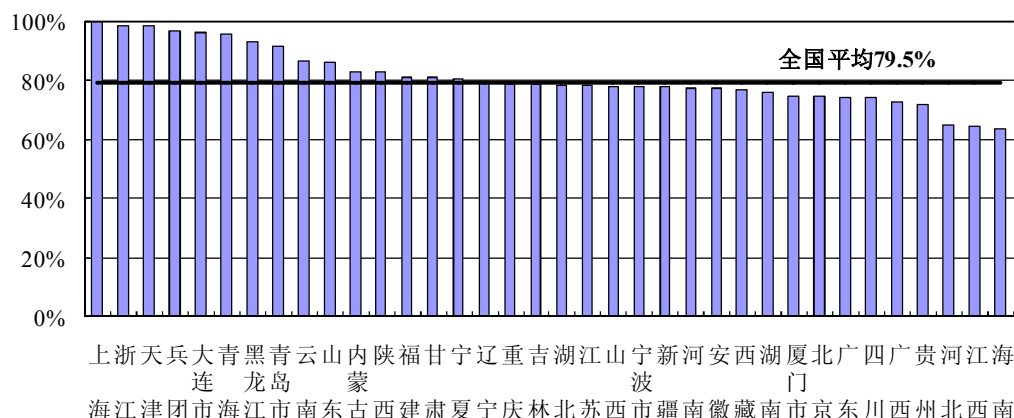

二、中央投资完成情况

截至2015年11月20日,已累计完成2015年中央投资1378.1亿元,完成率81.9%。中央投资完成率较高的地区有大连、黑龙江、浙江、江苏、山东和天津,较低省份有:海南、河北、广西、陕西和江西。

图2 2015年中央投资计划完成率
(按地区分)

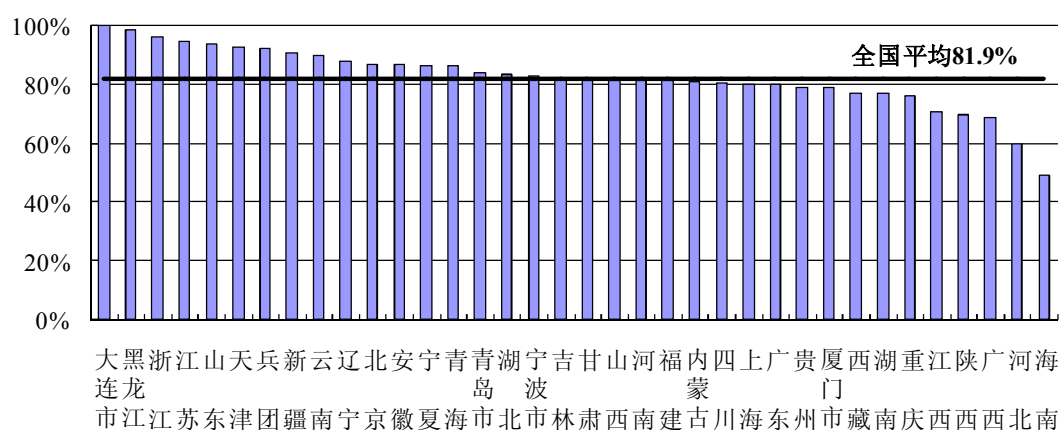

1. 中央预算内投资。已累计完成中央预算内水利投资计划1157.9亿元,完成率85.5%。其中,完成中央投资726.4亿元,

