

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2015-12)

2016 年第 1 期

水利部规划计划司

2016 年 1 月 10 日

2015 年 1 ~ 12 月，各地累计完成中央水利建设投资计划 3497.4 亿元，较上年同期增加 851.0 亿元，增幅 32.2%。当月完成中央投资计划 397.4 亿元，较上月减少 34.9 亿元。

## 一、2015 年中央水利建设投资情况

截至 2015 年 12 月 31 日，全年落实中央水利建设投资 1685.2 亿元，纳入月报统计的投资为 1683.3 亿元，已累计下达中央水利建设投资 1669.9 亿元(不含未到位的水利建设基金 13.4 亿元)，地方累计分解下达 1665.8 亿元、累计拨付项目单位资金 1671.5 亿元、累计完成投资 1601.8 亿元，中央投资分解下达率、资金到位率、投资完成率分别为 99.8%、100.0%和 95.9%，项目开工率为 99.3%。

分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资的落实及完成情况详见附表 1、附表 2。

### (一) 投资计划分解下达情况

2015年已安排中央水利建设投资计划2613.1亿元，其中，中央投资1669.9亿元，地方配套投资943.2亿元。截至12月31日，各地已分解下达到项目单位年度中央投资计划2671.4亿元，投资分解下达率102.2%。

**1. 中央预算内投资。**2015年已安排中央预算内水利投资计划1340.2亿元（中央投资825.7亿元，地方配套投资514.5亿元），地方已分解下达1397.9亿元，分解下达率104.3%。其中，中央投资已分解下达825.7亿元，分解下达率100%；地方配套投资已分解下达572.1亿元，分解下达率111.2%。

**2. 中央财政专项资金。**2015年中央财政水利专项资金预算1272.9亿元（中央资金844.2亿元，地方配套资金428.7亿元），已分解下达1273.5亿元，分解下达率100.0%。其中，中央资金已分解下达840.0亿元，分解下达率99.5%；地方配套资金已分解下达433.5亿元，分解下达率101.1%。从项目类别看，中央财政专项资金未全部分解下达的有小型病险水库除险加固、山洪灾害防治、农发资金用于水土保持和农发资金用于中型灌区，分解下达率分别为99.8%、98.0%、92.0%和88.0%。

其中，重大水利工程已安排年度中央水利投资计划996.4亿元（中央投资596.6亿元，地方配套投资399.8亿元），地方已分解下达999.6亿元，分解下达率100.3%。其中，中央投资已分解下达596.6亿元，分解下达率100%；地方配套投资已分解下达403.0亿元，分解下达率100.8%。

## **(二) 资金到位情况**

2015 年中央水利建设年度投资计划已拨付项目单位 2588.7 亿元，资金到位率 99.1%。其中，中央投资到位 1671.5 亿元，到位率 100%；地方配套投资到位 917.2 亿元，到位率 97.2%。

**1. 中央预算内投资。**2015 年中央预算内水利建设投资计划已拨付项目单位 1336.8 亿元，资金到位率 99.8%。其中，中央投资到位 821.7 亿元，到位率 99.5%；地方配套投资到位 515.1 亿元，到位率 100.1%。

**2. 中央财政专项资金。**2015 年中央财政水利专项资金预算已拨付项目单位 1251.8 亿元，资金到位率 98.3%。其中，中央资金到位 849.7 亿元，到位率为 100.7%；地方配套资金到位 402.1 亿元，到位率为 93.8%。


其中，重大水利工程投资已到位 954.6 亿元，资金到位率 95.8%。其中，中央投资到位 592.7 亿元，到位率 99.3%；地方配套投资到位 361.9 亿元，到位率 90.5%。

## **(三) 项目开工情况**

2015 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 15318 个，较上月增加 32 个，工程开工率 99.3%，较上月增加 2.4%。其中中央预算内水利投资计划 5075 个，累计开工 5056 个，开工率 99.6%；中央财政水利专项资金预算 10243 个，累计开工 10147 个，开工率 99.1%。

## **(四) 投资完成情况**


已累计完成 2015 年中央水利建设投资计划 2471.9 亿元，完成率 94.6%。其中，完成中央投资 1601.8 亿元，完成率 95.9%；完成地方配套投资 870.1 亿元，完成率 92.2%。当月完成中央投资计划 243.9 亿元，较上月减少 156.1 亿元，减幅 39.0%。其中，完成中央投资 162.3 亿元，较上月减少 54.0 亿元，减幅 25.0%；完成地方配套投资 81.7 亿元，较上月减少 102.2 亿元，减幅 55.6%。

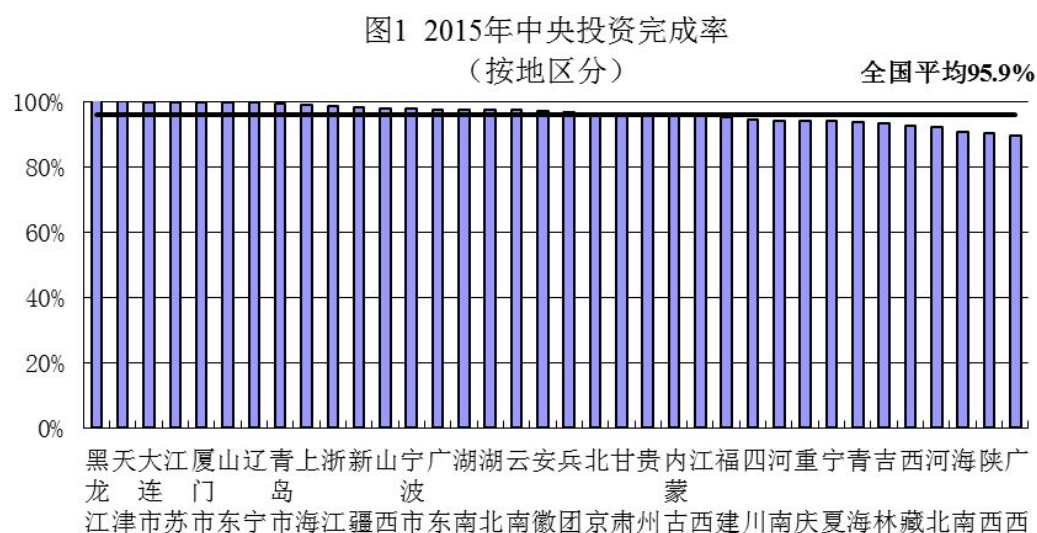

**1. 中央预算内投资。** 已累计完成中央预算内水利投资计划 1379.8 亿元，完成率 103.0%。其中，完成中央投资 806.6 亿元，完成率 97.7%；完成地方配套投资 573.2 亿元，完成率 111.4%。从项目类别看，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）除险加固、水土保持、中型水库、主要支流治理项目的中央投资完成率分别为 99.7%、96.6%、92.0%、98.3%和 94.4%。分地区中央预算内投资完成情况见图 2。



元，投资完成率为 96.6%。其中，完成中央投资 584.4 亿元，完成率 98.0%；完成地方配套投资 378.4 亿元，完成率 94.6%。从工程类别看，重大农业节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资完成率分别为 97.2%、96.2%、97.3%、99.0%、99.6%和 98.0%。

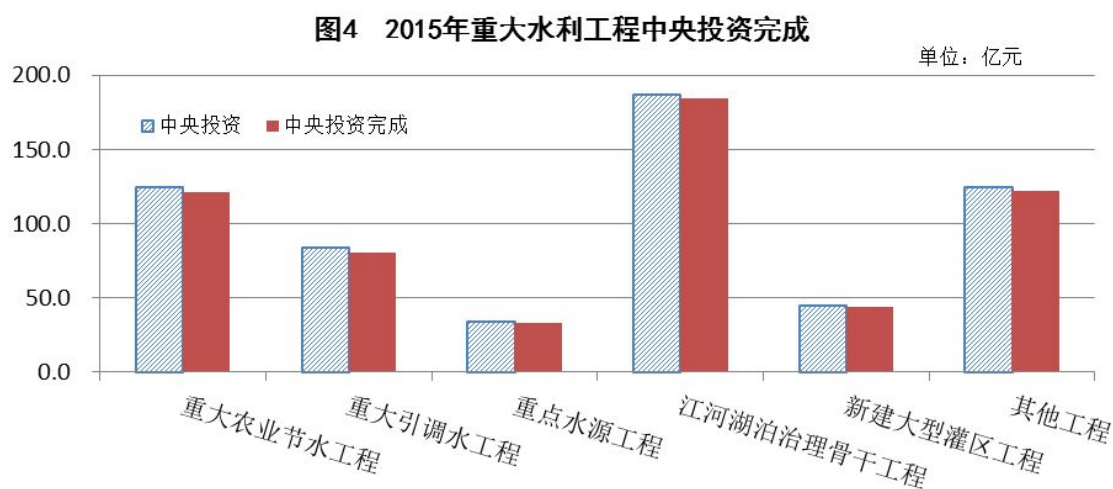

## 二、2014 年中央水利建设投资情况

截至 2015 年 12 月 31 日，纳入月报统计的 2014 年中央水利建设投资 1604.55 亿元，累计下达项目单位投资 1604.4 亿元，累计拨付项目单位资金 1599.7 亿元，项目单位累计完成投资 1572.0 亿元，投资下达率、资金到位率、投资完成率分别为 99.99%、99.7%和 98.0%。
