

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2016-1)

2016 年第 7 期

水利部规划计划司

2016 年 2 月 4 日

2016 年 1 月，各地累计完成中央水利建设投资计划 42.5 亿元，较上年同期减少 75.7 亿元，减幅 64.0%。

截至 2016 年 1 月 31 日，落实 2015 年中央水利建设投资 1685.2 亿元，纳入月报统计的投资为 1683.3 亿元，已累计下达中央水利建设投资 1669.9 亿元（不含未到位的水利建设基金 13.4 亿元），地方累计分解下达 1665.8 亿元、累计拨付项目单位资金 1671.5 亿元、累计完成投资 1612.6 亿元，中央投资分解下达率、资金到位率、投资完成率分别为 99.8%、100.0%和 96.6%，项目开工率为 99.4%。

分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资的落实及完成情况详见附表 1、附表 2。

一、投资计划分解下达情况

2015 年已安排中央水利建设投资计划 2613.4 亿元，其中，中央投资 1669.9 亿元，地方配套投资 943.5 亿元。截至 2016 年 1 月 31 日，各地已分解下达到项目单位年度中央投资计划 2671.9

亿元，投资分解下达率 102.2%。

1. 中央预算内投资。2015 年已安排中央预算内水利投资计划 1340.2 亿元（中央投资 825.7 亿元，地方配套投资 514.5 亿元），地方已分解下达 1398.0 亿元，分解下达率 104.3%。其中，中央投资已分解下达 825.7 亿元，分解下达率 100%；地方配套投资已分解下达 572.3 亿元，分解下达率 111.2%。

2. 中央财政专项资金。2015 年中央财政水利专项资金预算 1273.2 亿元（中央资金 844.2 亿元，地方配套资金 429.0 亿元），已分解下达 1273.9 亿元，分解下达率 100.0%。其中，中央资金已分解下达 840.0 亿元，分解下达率 99.5%；地方配套资金已分解下达 433.9 亿元，分解下达率 101.1%。从项目类别看，中央财政专项资金未全部分解下达的有小型病险水库除险加固、山洪灾害防治、农发资金用于水土保持和农发资金用于中型灌区，分解下达率分别为 99.8%、98.0%、92.0%和 88.0%。

其中，重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 996.4 亿元（中央投资 596.6 亿元，地方配套投资 399.8 亿元），地方已分解下达 999.7 亿元，分解下达率 100.3%。其中，中央投资已分解下达 596.6 亿元，分解下达率 100%；地方配套投资已分解下达 403.1 亿元，分解下达率 100.8%。

二、资金到位情况

2015 年中央水利建设年度投资计划已拨付项目单位 2595.6 亿元，资金到位率 99.3%。其中，中央投资到位 1671.5 亿元，

到位率 100%；地方配套投资到位 924.2 亿元，到位率 98.0%。

1. 中央预算内投资。2015 年中央预算内水利建设投资计划已拨付项目单位 1340.8 亿元，资金到位率 100%。其中，中央投资到位 821.8 亿元，到位率 99.5%；地方配套投资到位 519.0 亿元，到位率 100.9%。

2. 中央财政专项资金。2015 年中央财政水利专项资金预算已拨付项目单位 1254.8 亿元，资金到位率 98.5%。其中，中央资金到位 849.6 亿元，到位率为 100.6%；地方配套资金到位 405.2 亿元，到位率为 94.5%。

其中，重大水利工程投资已到位 959.7 亿元，资金到位率 96.3%。其中，中央投资到位 592.7 亿元，到位率 99.3%；地方配套投资到位 367.0 亿元，到位率 91.8%。


三、项目开工情况

2015 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 15308 个，工程开工率 99.4%，较上月增加 0.1%。其中中央预算内水利投资计划 5075 个，累计开工 5059 个，开工率 99.7%；中央财政水利专项资金预算 10233 个（与上月相比减少 10 个主要是因为新疆兵团水利局对项目进行整合调整），累计开工 10157 个，开工率 99.3%。


四、投资完成情况

已累计完成 2015 年中央水利建设投资计划 2489.1 亿元，完成率 95.3%。其中，完成中央投资 1612.6 亿元，完成率 96.6%；


完成地方配套投资 876.5 亿元，完成率 92.9%。

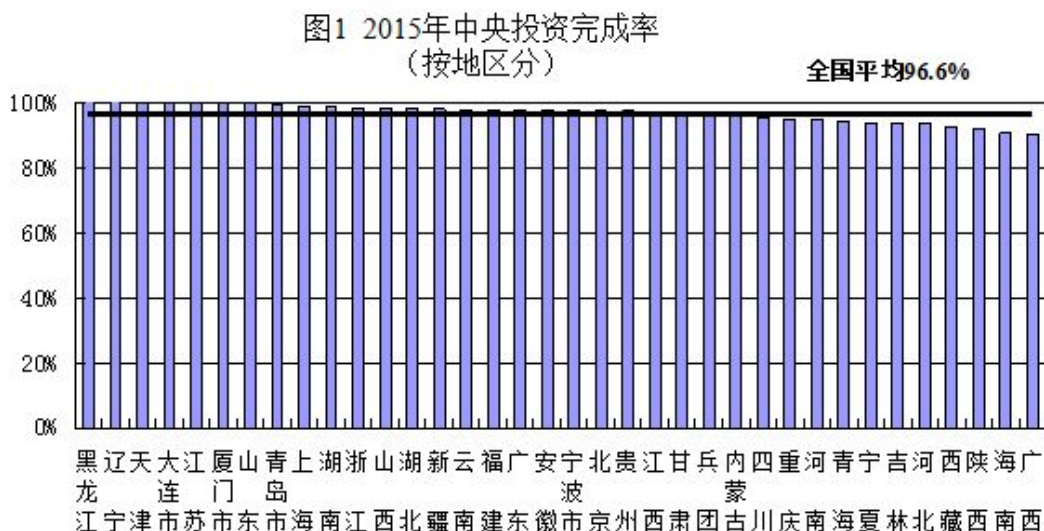

1. 中央预算内投资。 已累计完成中央预算内水利投资计划 1401.9 亿元，完成率 104.6%。其中，完成中央投资 812.9 亿元，完成率 98.4%；完成地方配套投资 589.0 亿元，完成率 114.5%。从项目类别看，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）除险加固、水土保持、中型水库、主要支流治理项目的中央投资完成率分别为 99.7%、97.0%、93.6%、99.3%和 96.1%。分地区中央预算内投资完成情况见图 2。

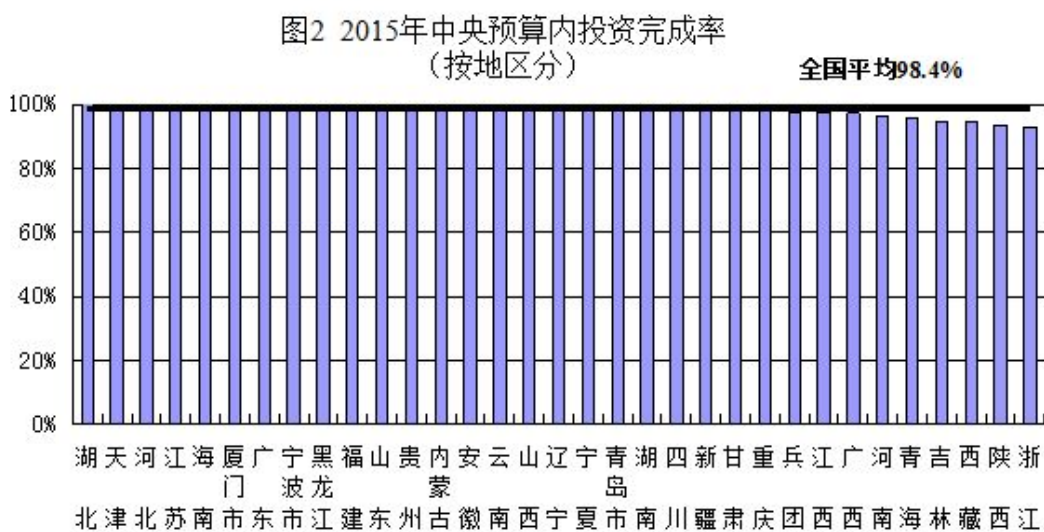

2. **中央财政专项资金。**已累计完成中央财政水利专项资金预算 1227.3 亿元，完成率 96.4%。其中，完成中央资金 810.0 亿元，完成率 96.0%；完成地方配套资金 417.3 亿元，完成率 97.3%。从项目类别看，江河湖库水系综合整治、山洪灾害防治、农田水利建设和水土保持专项的中央资金完成率分别为 93.2%、98.2%、96.1%。分地区中央财政专项资金完成情况见图 3。

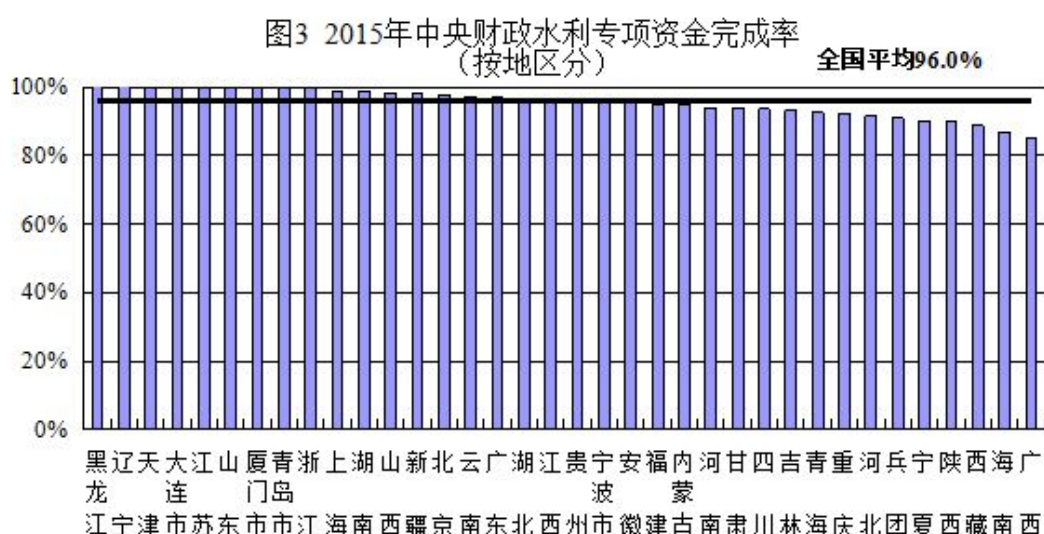

其中，重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 973.6 亿元，投资完成率为 97.7%。其中，完成中央投资 588.6 亿元，完成率 98.7%；完成地方配套投资 385.0 亿元，完成率 96.3%。从工程类别看，重大农业节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资完成率分别为 98.0%、97.7%、97.3%、99.2%、99.6%和 99.2%。

图4 2015年重大水利工程中央投资完成

单位：亿元

