

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计旬报 2016-11-20)

2016 年第 45 期

水利部规划计划司


2016 年 11 月 25 日

据统计，截至 2016 年 11 月 20 日，中央水利建设投资完成情况如下：

一、2016 年投资计划完成情况

2016 年已安排中央水利建设投资计划 2224.6 亿元，其中，中央投资 1413.4 亿元，地方配套投资 811.3 亿元。各地累计完成年度中央投资计划 1813.6 亿元，投资计划完成率 81.5%，较 10 月底增加 6.3 个百分点。其中完成中央投资 1198.9 亿元，投资完成率为 84.8%，较 10 月底增加 6.1 个百分点；完成地方配套投资 614.7 亿元，投资完成率为 75.8%，较 10 月底增加 6.7 个百分点。11 月上中旬完成 141.2 亿元，其中，完成中央投资 86.7 亿元，完成地方配套投资 54.5 亿元。


图1 2016年年度投资计划完成率
(按地区分)

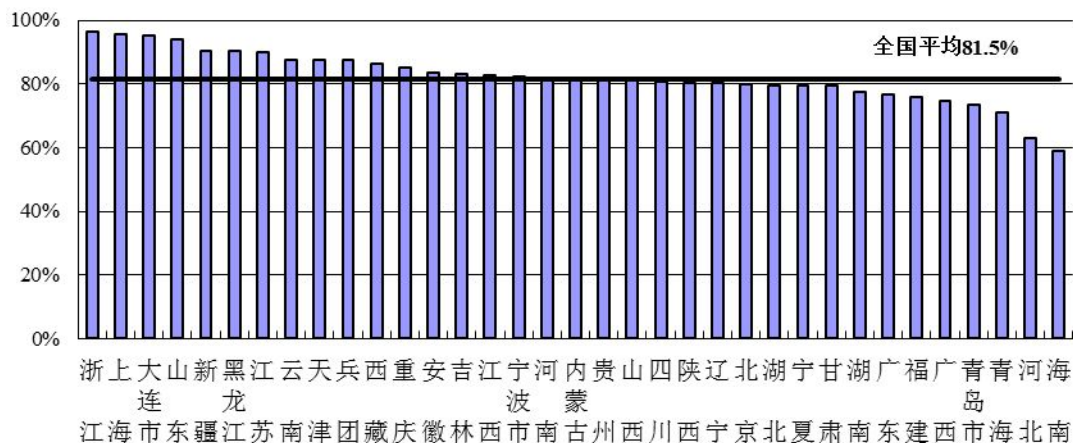

二、中央投资完成情况

截至2016年11月20日,已累计完成2016年中央投资1198.9亿元,完成率为84.8%。

图2 2016年中央投资完成率
(按地区分)

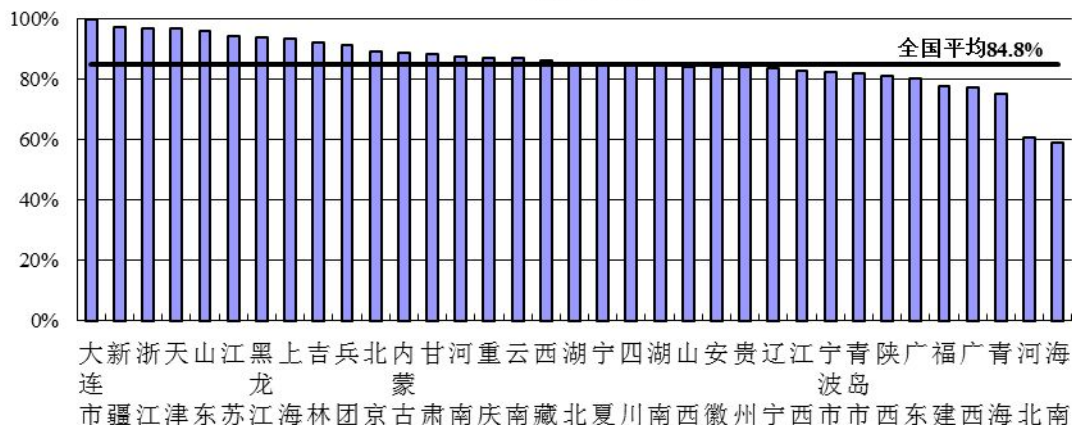

1. 中央预算内投资。已累计完成中央预算内水利投资计划1184.7亿元,完成率为81.4%。其中,完成中央投资705.0亿元,完成率为86.4%;完成地方配套投资479.7亿元,完成率为75.1%。从项目类别看,农村饮水安全巩固提升工程、大中型病险水库

(闸)除险加固、水土保持和生态建设、中型水库、主要支流治理、大型排灌泵站更新改造、农村小水电和行业能力建设中央投资完成率分别为 86.4%、81.8%、78.7%、89.2%、75.9%、83.9%、84.5%和 56.9%，较 10 月底分别增加 9.1、5.9、18.8、3.4、6.8、6.7、7.0 和 3.2 个百分点。

2. 中央财政专项资金。已累计完成中央财政水利专项资金预算 628.9 亿元，完成率 81.7%。其中，完成中央资金 493.8 亿元，完成率 82.7%；完成地方配套资金 135.1 亿元，完成率 78.3%。从项目类别看，江河湖库水系综合整治、小型农田水利、水土保持和山洪灾害防治项目的中央资金完成率分别为 81.3%、83.5%、79.0%和 87.3%，较 10 月底分别增加 4.7、7.2、9.7 和 4.0 个百分点。

三、重大水利工程投资完成情况

截至 2016 年 11 月 20 日，重大水利工程已累计完成年度中央水利投资计划 849.3 亿元，投资完成率为 82.4%，较 10 月底增加 6.1 个百分点。其中，完成中央投资 530.0 亿元，完成率 88.3%，较 10 月底增加 5.5 个百分点；完成地方配套投资 319.3 亿元，完成率 74.1%，较 10 月底增加 6.8 个百分点。从工程类别看，重大农业节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资完成率分别为 86.6%、81.1%、77.9%、90.3%、90.1%和 98.0%，较

10 月底分别增加 7.3、6.0、7.7、4.6、7.6 和 2.7 个百分点。
